



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Gemeente Oldambt

t.a.v. 5.1.2.e

Postbus 175

9670 AD Winschoten

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

5.1.2.e

T 5.1.2.e

Ons kenmerk

38276619

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum 23 november 2023

Betreft Advies SodM over programma van aanpak 2024

Geachte 5.1.2.e

Op vrijdag 20 oktober 2023 heb ik per e-mail een verzoek om advies van de gemeente Oldambt over het concept programma van aanpak¹ voor 2024 (inclusief adreslijst) ontvangen.²

Samenvatting

Ik kan mij vinden in de opzet van het concept programma van aanpak voor 2024, zoals ingediend 20 oktober 2023. De versterkingsopgave wordt, volgens de planning van het Meerjaren Versterkingsplan (hierna: MJVP), naar verwachting in 2026 afgerond door Oldambt.

Ik constateer dat de gemeenteraad van Oldambt haar programma van aanpak slechts gedeeltelijk heeft gebaseerd op de door de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: de NCG) aangeleverde conceptversie van het MJVP van 12 oktober 2023.³ Ik licht de afwijkingen tussen de adreslijst (behorende bij het concept programma van aanpak) en het MJVP toe nader toe op pagina drie van dit advies.

Ik adviseer dat de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: de NCG) de vastgestelde adreslijst (en de gevolgen daarvan) op een zodanige manier verwerkt in het Meerjaren Versterkingsplan dat dit geen significant nadelige invloed heeft op de voortgang en het afronden van de versterkingsopgave en dat dit voldoet aan de vereisten voor prioritering.

Voor wat betreft het combineren van de versterkingsopgave met verduurzamingsmaatregelen, constateer ik dat verduurzamingsmaatregelen kunnen worden meegenomen in de versterking onder de voorwaarde dat dit geen significante vertraging oplevert.

¹ De gemeente gebruikt zelf de term 'lokaal plan van aanpak'. Waar in dit advies 'programma van aanpak' wordt genoemd, doel ik op het plan van aanpak 2024 versterking van Oldambt, versie 20 oktober 2023.

² Ik ga er van uit dat het verzoek per e-mail van 20 oktober 2023 is ingediend namens de gemeenteraad van Oldambt, zoals bepaald in artikel 13g, derde lid, sub a, van de Tijdelijke Wet Groningen.

³ Zie bijlage 1 en 2 voor meer informatie over de versie van het MJVP en het bronbestand die door de gemeente Oldambt is gebruikt voor het opstellen van het programma van aanpak.

Ik licht hieronder mijn advies nader toe. Allereerst ga ik in op het wettelijk kader van de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: TWG) en de gevolgen voor mijn rol als toezichthouder. Daarna formuleer ik de adviesvraag, de criteria voor beantwoording van de adviesvraag en vervolgens de beantwoording van de adviesvraag. Ik sluit af met mijn advies. In het advies besteed ik ook aandacht aan signalen over de achterblijvende snelheid in de uitvoering van de versterking.

Wettelijk kader

Uit de TWG volgt dat de inspecteur-generaal der mijnen binnen zes weken na het verzoek van de gemeenteraad een advies uitbrengt over het ontwerp programma van aanpak. In het BTWG zijn regels gesteld over de inhoud en reikwijdte van de advisering door de inspecteur-generaal der mijnen.⁴ De inspecteur-generaal der mijnen geeft een advies in relatie tot de veiligheid.⁵

De gemeenteraad kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies van de inspecteur-generaal der mijnen bij de vaststelling van het programma van aanpak.⁶

Adviesvraag

Uit het wettelijk kader volgt dat ik beoordeel of een programma van aanpak:

- voldoende gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave; en
- voldoet aan de genoemde voorwaarden uit artikel 10c, tweede, derde of vierde lid, van het BTWG.

Bij deze beoordeling staat de veiligheid van de versterkingsoperatie centraal, wat betekent dat ik bij de beoordeling van een programma van aanpak rekening houd met de criteria reikwijdte, tijdigheid van de uitvoering van de versterkingsoperatie en prioritering.⁷

Uitwerking criteria adviesvraag

In deze paragraaf beschrijf ik mijn bevindingen aan de hand van de twee criteria die volgen uit het wettelijk kader. Ik voeg daar nog een derde aandachtspunt aan toe, namelijk of de gemeente mijn adviezen van vorig jaar heeft opgevolgd. Aan de hand van mijn bevindingen, zal ik antwoord geven op de adviesvraag en formuleer ik mijn advies voor de gemeenteraad.

⁴ Artikel 10c en 10d van het Besluit Tijdelijke Wet Groningen.

⁵ Artikel 13g, derde lid, juncto vierde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen.

⁶ Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht.

⁷ Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35 603, nr. 3, p. 44. Deze criteria zijn afkomstig uit het Besluit versterking gebouwen Groningen. Het eerste criterium (reikwijdte) gaat over de vraag of de juiste scope wordt gehanteerd, het tweede criterium (tijdigheid) gaat over de vraag of de maatregelen leiden tot een tijdig voldoen aan de norm en het laatste criterium (prioritering) over de vraag of de risicovolle gebouwen voorrang krijgen (zie de [Nota van Toelichting](#) op het Besluit versterking gebouwen Groningen, p. 18).

Is het programma van aanpak voldoende gericht op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave?

Het programma van aanpak van de gemeenteraad van Oldambt is voor het richting uitvoering brengen weliswaar afwijkend, maar de planning in het MJVP is voldoende gericht op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave. Ik kijk hiervoor naar de reikwijdte en de tijdigheid van de uitvoering van de versterking.

De gemeenteraad van Oldambt heeft haar programma van aanpak slechts gedeeltelijk gebaseerd op de door de NCG aangeleverde conceptversie van het MJVP van 12 oktober 2023.⁸ Ik licht de afwijkingen tussen de adreslijst (behorende bij het concept programma van aanpak) en het MJVP in de paragraaf 'Tijdigheid' toe.

Scope

Uit de beoordeling van het programma van aanpak inclusief het bronbestand⁹ volgt dat de werkvoorraad is toegenomen tot 507 adressen en dat meer dan 85 procent van de totale werkvoorraad is beoordeeld.¹⁰ Inclusief het vierde kwartaal van 2023 moeten er volgens het Meerjaren Versterkingsplan van 12 oktober 2023 (hierna: MJVP) nog 5 adressen worden opgenomen, moeten 12 + 38 adressen nog worden beoordeeld en moeten 20 adressen een herbeoordeling krijgen.¹¹ Uit het bronbestand blijkt dat er in totaal nog 71 adressen moeten worden beoordeeld, dat is er 1 meer dan is ingepland in het MJVP. Dit kleine verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillende datums van de datasets. Voor wat betreft het versterken van gebouwen, wordt voor 31 adressen in 2024 de planvorming gestart om deze adressen richting uitvoering te kunnen brengen.¹²

Tijdigheid

De planning van de gemeenteraad voor 2024 komt voor wat betreft het starten van de planvorming niet geheel overeen met het MJVP. Het college heeft voor 2024 een aantal adressen ingepland in haar programma van aanpak die niet zijn ingepland in het MJVP (versie 2023 oktober).¹³ In het MJVP staan aanvullend adressen gepland die niet in de adreslijst en het programma van aanpak worden aangegeven. De gemeenteraad is dus voornemens om een wijziging aan te brengen in de adressen die zijn ingepland door de NCG in het MJVP.

⁸ Zie bijlage 1 en 2 voor meer informatie over de versie van het MJVP en het bronbestand die door de gemeente Oldambt is gebruikt voor het opstellen van het programma van aanpak.

⁹ Zie bijlage 1 voor meer informatie.

¹⁰ Zie tabel 1 voor een weergave van de werkvoorraad, de nieuwe adressen die zijn toegevoegd aan de werkvoorraad, en de samenstelling van de werkvoorraad.

¹¹ Zie tabel 1 en 14. De aantallen zijn gesplitst in Q4 2023 en 2024.

¹² Zie tabel 8 en 9.

¹³ Zie bijlage 1 en 2 voor meer informatie over de versie van het MJVP en het bronbestand die door de gemeente Eemsdelta is gebruikt voor het opstellen van het programma van aanpak.

Ik licht dit hieronder kort samengevat toe:

- de adreslijst bevat 70 adressen waarvan er naar verwachting 13 overblijven om in 2024 richting uitvoering te brengen. Van deze 13 adressen staan er slechts 10 ingepland voor 2024 in het MJVP. Bij het eindtotaal staan er ook maar 10 adressen aangegeven in het MJVP.
- Het MJVP bevat aanvullend 21 adressen die niet in de adreslijst en het programma van aanpak vermeld staan.
- Uit navraag bij de NCG blijkt dat alle adressen die nog geen beoordeling hebben gehad, maar naar verwachting op norm beoordeeld zullen worden, ook zijn opgenomen in de adreslijst.

Uit het bovenstaande volgt dat de aantallen – en daarmee ook de adressen – in de adreslijst van het programma van aanpak niet aansluiten op de planning in het MJVP. Ik merk op dat deze afwijkingen niet mogen leiden tot een verschuiving van de termijn voor de afronding van de versterkingsopgave. Afronding van de versterkingsopgave heeft prioriteit.

Ik kan niet beoordelen of de NCG deze adreslijst zal overnemen (in de planning van) het MJVP. Ook kan ik niet beoordelen wat de invloed zal zijn van het verwerken van de adreslijst in het MJVP. Zo heb ik geen zicht op de eventuele gevolgen voor het behalen van de deadline voor de afronding van de versterkingsopgave in 2028. Daarom adviseer ik dat de NCG de vast te stellen adreslijst (en de gevolgen daarvan) op een zodanige manier in het MJVP dat dit geen significant nadelige invloed heeft op de voortgang en het afronden van de versterkingsopgave en dat dit voldoet aan de vereisten voor prioritering.

Ik zal in de volgende op het programma van aanpak afgestemde versie van het MJVP verifiëren of de vastgestelde adreslijst is opgenomen en wat daarvan de gevolgen zijn.

Voor wat betreft de voortgang van de adressen die in 2023 versterkt worden opgeleverd¹⁴, constateer ik het volgende. In de planning van het MJVP voor 2023 zijn er 10 adressen ingepland om te worden versterkt.¹⁵ Volgens het bronbestand¹⁶ zijn er tot en met 2 oktober jl. geen adressen versterkt, wat betekent dat er tot einde 2023 nog 10 adressen versterkt moeten worden opgeleverd.¹⁷ Ter vergelijking, in 2022 zijn er 4 adressen versterkt opgeleverd. Tegelijkertijd constateer ik ook dat er voor 2024 in het MJVP 29 adressen zijn gepland om te worden versterkt. Dat betekent dat er voor komend jaar al een versnelling met factor 3 in de uitvoering van de versterking is gepland ten opzichte van 2023. Voor 2025 is een nog veel hoger aantal van 50 te versterken adressen gepland.

¹⁴ En daarmee in Mijlpaal 11 Bouw gereed terechtkomen. Mijlpaal 11 Bouw gereed betekent dat de bouwwerkzaamheden gereed zijn en de woning versterkt is opgeleverd. Bron: [De versterking in stappen | Versterken: hoe werkt het? | Nationaal Coördinator Groningen \(nationaalcoördinatorgroningen.nl\)](#).

¹⁵ Zie tabel 16 van bijlage 2.

¹⁶ Zie Bijlage 2 voor meer informatie over het Bronbestand.

¹⁷ Zie tabel 14 van bijlage 2.

In de voortgangsrapportage heeft SodM reeds benadrukt dat deze geplande versnelling nog niet zichtbaar is, en dat het tempo van de NCG fors omhoog moet om de versterkingsoperatie in 2028 af te kunnen ronden.¹⁸

Voldoet het programma van aanpak aan de genoemde voorwaarden uit artikel 10c, tweede, derde of vierde lid, van het BTWG?

De planning in het MJVP voor de gemeente Oldambt voldoet aan de vereisten van prioritering vanuit het oogpunt van veiligheid. Voor wat betreft de adreslijst, merk ik op dat deze adreslijst slechts gedeeltelijk overeenkomt met de adressen in het MJVP. Dat heeft tot gevolg dat ik slechts voor de adressen die zijn opgenomen in het MJVP én die overeenkomen met de adressen in de adreslijst, kan beoordelen dat die voldoen aan de vereisten van de prioritering vanuit het oogpunt van veiligheid.

Het blijft van belang dat het programma van aanpak te allen tijde voldoet aan de voorwaarden van artikel 10c, tweede, derde of vierde lid, van het BTWG voldoet.

Zijn de adviezen van de inspecteur-generaal der mijnen uit de beoordeling van 2023 door de gemeente opgevolgd?

Bij de beoordeling van de lokale plannen voor 2023 heb ik een tweetal adviezen over meegegeven aan het college ter opvolging. De adviezen gaan over 1) de blijvende goede afstemming met de NCG over de verwerking van het lokale plan van aanpak in het MJVP en 2) de clustering van adressen.¹⁹ Ik constateer dat deze adviezen zijn opgevolgd.

Voor wat betreft het tweede advies, zie ik dat een dorpsgerichte versterkingsaanpak wordt gehanteerd in Oldambt en dat daar voor 2024 wederom aandacht aan is besteed.

Beantwoording adviesvraag

Voor wat betreft de vraag of het programma van aanpak gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de versterkingsopgave, zie ik dat de versterkingsopgave, volgens de planning in het MJVP, naar verwachting in 2026 wordt afgerond door Oldambt. Tegelijkertijd constateer ik een afwijking tussen de adreslijst en het door mij beoordeelde concept van het MJVP. Ik verwijs naar de paragraaf 'advies' voor mijn advies hierover.

Ook signaleer ik een aandachtspunt omtrent de uitvoering van de versterking voor iedere gemeente. Of het programma van aanpak conform de planning wordt gerealiseerd, hangt onder meer af van de capaciteit van de NCG en of zij passende maatregelen neemt om de planning te halen. Uit de afgelopen jaren blijkt dat de NCG de beschikbare capaciteit te hoog had ingeschat en/of dat er door de betrokken partijen – o.a. de gemeenten en de NCG - onvoldoende maatregelen genomen zijn om de planning te realiseren, als gevolg waarvan de geplande uitvoering niet (altijd) werd gehaald.

¹⁸ SodM, [Voortgang van de versterkingsopgave en afbouw van de gaswinning \('22-'23\) – jaarlijks voortgangsverslag van het SodM](#), p. 34.

¹⁹ Zie beoordeling door het SodM, [plan van aanpak Eemsdelta](#), p. 5.

Daarom blijft voortdurende afstemming tussen de gemeenten en de NCG over welke maatregelen nodig zijn om de planning te halen van belang om verdere vertraging te voorkomen.

Verder volgt uit het programma van aanpak dat waar mogelijk de verwachte impact van de parlementaire enquête en de kabinetsmaatregelen 'Nij begun' benoemd zijn in het programma van aanpak en dat komende periode de invloed hiervan verder uitgewerkt wordt. In dat verband merk ik het volgende op. Ik ben van oordeel dat snelheid (en daarmee tijdigheid) vanuit oogpunt van veiligheid essentieel is, en daarom de versterking eerste prioriteit heeft. Het meenemen van verduurzamingsmaatregelen in de versterking kan onder voorwaarde dat dit geen significante vertraging oplevert. De verduurzaming van gebouwen die slechts licht moeten worden versterkt, maar waarbij verduurzaming wel significant nadelige gevolgen heeft voor de doorlooptijden, moet gescheiden blijven van de huidige taken van de NCG. Dit geldt ook voor de (mogelijke) verduurzaming van gebouwen die niet versterkt hoeven te worden of al eerder zonder verduurzamingsmaatregelen zijn versterkt. Uiteraard staat het gemeenten vrij om andere activiteiten (zoals verbetering van de ruimtelijke kwaliteit) te organiseren en te ontplooiën binnen de gebiedsgerichte werkwijze van de versterking die in het lokale programma van aanpak beschreven is.

Advies

Ik kan mij vinden in de opzet van het concept programma van aanpak voor 2024, zoals ingediend op 20 oktober 2023. Tegelijkertijd constateer ik afwijkende aantallen adressen in het programma van aanpak en in de bijbehorende adreslijst, vergeleken met het door mij beoordeelde concept van het MJVP. Ik adviseer u om deze afwijkingen te beoordelen voordat uw gemeenteraad het programma van aanpak en de adreslijst vaststelt.

Aanvullend adviseer ik dat de NCG de vastgestelde adreslijst (en de gevolgen daarvan) op een zodanige manier verwerkt in het MJVP dat dit geen significant nadelige invloed heeft op de voortgang en het afronden van de versterkingsopgave en dat dit voldoet aan de vereisten voor prioritering.

Voor wat betreft het combineren van de versterkingsopgave met verduurzamingsmaatregelen, constateer ik dat verduurzamingsmaatregelen kunnen worden meegenomen in de versterking onder de voorwaarde dat dit geen significante vertraging oplevert.

Afsluitend

Nadat de gemeenteraad van Oldambt de adreslijst heeft vastgesteld verzoek ik u mij deze adreslijst toe te sturen. Deze adreslijst zal ik toetsen aan het op het programma van aanpak af te stemmen MJVP en beoordelen of de adreslijst is verwerkt in het MJVP en wat de gevolgen daarvan zijn. Indien de adreslijst niet is opgenomen of negatieve gevolgen heeft voor de planning in het MJVP, zal ik de gemeenteraad hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e




ir. T.F. Kockelkoren, MBA
inspecteur-generaal der mijnen

Bijlage 1: beoordeling programma van aanpak

Werkvoorraad

Oldambt heeft, vergeleken met het gehele werkvoorraad van de vijf aardbevingsgemeenten, een relatief een hoog percentage (95%) adressen met een licht verhoogd risicoprofiel en relatief laag percentage met een normaal risicoprofiel (4%) en verhoogd risico profiel (1%).

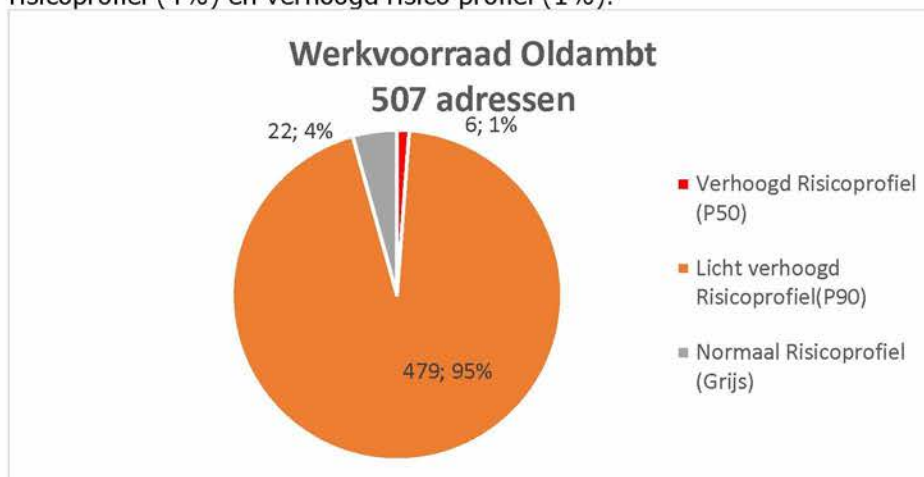

Figuur 1. Verdeling van de totale werkvoorraad per 1 oktober 2023

Sinds 1 oktober 2022 zijn er 2 adressen met een normaal risico toegevoegd aan de werkvoorraad, zodat de werkvoorraad nu bestaat uit 507 adressen. Meer dan 85% van de werkvoorraad is inmiddels beoordeeld, waarvan 303 adressen direct aan de versterkingsnorm voldoen en niet meer versterkt hoeven te worden (zie tabel 1).

Voortgang tot 1 oktober 2023	Werk voorraad 1 okt 2022	Mutaties	Werk voorraad 1 okt 2023	Opname uitgevoerd	Beoordeling vastgesteld	Planvorming gestart	Bouw Gestart	Bouw gereed	Direct op Norm beoordeeld	Anders, bv Sloopen niet herbouwd	Totaal Bouw gereed, Direct op Norm & Sloopen niet herbouwd
Verhoogd Risicoprofiel (P50)	6	0	6	6	6	5	1	0	2	0	2
Licht verhoogd Risicoprofiel (P90)	479	0	479	417	414	77	7	4	287	10	301
Normaal Risicoprofiel (Grijs)	20	2	22	20	15	1	1	1	14	0	15
Totaal	505	2	507	443	435	83	9	5	303	10	318
Aantal 12 maanden daarvoor	<u>499</u>	<u>6</u>	<u>505</u>	<u>428</u>	<u>374</u>	<u>68</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>262</u>	<u>10</u>	<u>275</u>
Toename afgelopen 12 maanden	6	2	15	61	15	15	4	2	41		43

Tabel 1: Situatie van de versterking per 1 oktober 2023 van de gemeente Oldambt. Cijfers volgens brondata NCG 2-okt-2023.

Opname en beoordeling

Van de totale werkvoorraad van 507 adressen zijn er inmiddels 435 beoordeeld en hebben de fase van Opname en Normering afgerond. In het laatste kwartaal van 2023 zouden er volgens de planning nog 15 adressen beoordeeld moeten worden. Daarnaast zijn er 7 adressen al verder in het versterkingsproces zonder dat deze Mijlpaal 5 'Beoordeling vastgesteld' hebben doorlopen. In het Meerjaren Versterkingsplan (hierna: MJVP) zijn er dan nog 38 adressen ingepland om beoordeeld te worden in 2024. Er blijven dan nog een aantal adressen (waaronder 10 weigeraars) van de huidige werkvoorraad die nog niet beoordeeld zijn. Dit zou kunnen met behulp van de Praktijkaanpak 2.0. Deze adressen zitten nog niet in de planning van het MJVP. Eventuele extra adressen die nog worden toegevoegd aan de werkvoorraad, zullen door de NCG dan ook nog in 2024 moeten worden beoordeeld. De aantallen voor deze afronding van de fase van Opname & Normering worden niet in het Programma van aanpak voor 2024 (hierna: PVA) van Oldambt vermeld, omdat de gemeente nog niet weet hoeveel adressen de NCG in het laatste kwartaal van 2023 nog kan beoordelen (zie tabel 2).

Opname en Beoordeling	Werk voorraad	Mijlpaal 5 Beoordeling vastgesteld	Nog gepland om in 2023 beoordeeld te worden	Adressen al verder in het versterkingsproces zonder Mijlpaal 5 beoordeling vastgesteld, doorlopen te hebben	Mijlpaal 5 Beoordeling vastgesteld nog af te ronden in 2024	Na 2024 Beoordeling nog af te ronden
Verhoogd (P50)	6	6	0	0	0	-
Licht verhoogd (P90)	479	414	15	7	38	-
Normaal (Grijs)	22	15	0	0	0	-
Totaal	507	435	15	7	38	-

Tabel 2: Opname & Beoordeling per 1 oktober 2023 van gemeente Oldambt, volgens brondata (2 okt 2023) en MJVP (2023 oktober), wanneer mijlpaal 5 'Beoordeling vastgesteld' bereikt wordt en de fase van Opname&Normering kan worden afgesloten. Daarna kan een adres of door naar Ontwerp&Realisatie om versterkt te worden of wanneer het op norm is beoordeeld door naar 'Afgerond'. Er zijn inmiddels 7 adressen al verder in het versterkingsproces zonder mijlpaal 5 'Beoordeling vastgesteld' doorlopen te hebben. Hieronder 5 adressen die Mijlpaal 9 Versterkingsbesluit genomen bereikt heeft zonder een datum voor beoordeling.

Adressen die in uitvoering worden gebracht in 2024

Van de totale werkvoorraad van 507 adressen hoeven er 318 adressen niet meer te worden versterkt. Ze zijn versterkt (5), direct op norm beoordeeld (303) of anders afgerond waaronder gesloopt en niet herbouwd (10) (zie tabel 1). Er zijn inmiddels 83 adressen met planvorming gestart, waaronder 15 de afgelopen 12 maanden (Q4-2022-t/m Q3-2023, zie tabel 3). Van de geplande adressen in het MJVP moeten er dit jaar nog 7 adressen met de planvorming starten en zijn er al 308 verder in het uitvoeringsproces zonder een datum voor planvorming gestart te hebben. In 2024 verwacht het MJVP dat Oldambt met 32 adressen (gewogen: 30,6 adressen) mijlpaal 7 Planvorming te kunnen gaan starten waarna alle adressen van de huidige werkvoorraad die in aanmerking komen voor Planvorming deze mijlpaal in 2024 doorlopen zullen hebben.

Voor de fase van planvorming wordt per adres een wegingsfactor toegekend die bepaalt hoe zwaar een adres op de planning drukt. Een gebouw waarvan op basis van de typologieaanpak verwacht wordt dat het aan de veiligheidsnorm zal voldoen, heeft een snellere doorlooptijd dan een gebouw dat versterkt moet worden. Bedoelde wegingsfactor van 0 tot 1 maakt dat er dus meer adressen in een plan van aanpak zijn opgenomen dan er capaciteit beschikbaar is. Dit is een schatting voor elk adres en de versterking kan in de praktijk meevallen (kortere doorlooptijd) of tegenvallen (langere doorlooptijd).

Na het toepassen van de wegingsfactor moet de bij de NCG beschikbare capaciteit volledig zijn ingevuld of moet er capaciteit overblijven om de planning in het MJVP te kunnen halen. Adressen die bijvoorbeeld na beoordeling op norm blijken hoeven dan ook niet meer met de planvorming te starten.

Adressen richting uitvoering, Ontwerp & Realisatie starten	Werk voorraad	Adressen richting uitvoering afgerond (Mijlpaal 7 Planvorming (PV) gestart t/m Q3 2023)	Nog gepland om in 2023 PV te starten (Mijlpaal 7)	Adressen al verder in uitvoering zonder Mijlpaal 7 PV gestart doorlopen te hebben	Mijlpaal 7 PV starten in 2024 volgens het MJVP - adressen	Mijlpaal 7 PV starten in 2024 volgens het MJVP - gewogen adressen	Na 2024 planvorming nog te starten volgens het MJVP - adressen	Na 2024 planvorming nog te starten volgens het MJVP - gewogen adressen
Verhoogd (P50)	6	5	0	1	0	0,0	0	0,0
Licht verhoogd (P90)	479	77	7	293	28	27,3	0	0,0
Normaal (Grijs)	22	1	0	14	4	3,3	0	0,0
Totaal	507	83	7	308	32	30,6	0	0,0
Aantal 12 maanden daarvoor	505	68						
Toename afgelopen 12 maanden	2	15						

Tabel 3: Adressen richting de uitvoering brengen Mijlpaal 7 Planvorming gestart, gemeente Oldambt, brondata per 1 oktober 2023. En de verwachte datum van de Planvorming gestart in het MJVP (versie 2023-oktober).

Hoe komt het PVA2024 overeen met het MVJP?

De NCG verdeelt elk jaar de beschikbare capaciteit om adressen met Ontwerp en Realisatie te laten starten over de vijf aardbevingsgemeenten. Voor volgend jaar heeft de NCG aangegeven ruimte te hebben om met 31,6 gewogen adressen de planvorming in Oldambt te kunnen starten (1,4% van de totaal beschikbare capaciteit van 2.218). Hierin is ook de capaciteit meegenomen voor de 21 adressen (20,3 gewogen) die in het Lokale Plan van Aanpak 2023 stonden en nu in 2024 richting de uitvoering worden gebracht.

In het PVA2024 van Oldambt wordt een capaciteit genoemd van 47 adressen om richting uitvoering te brengen.

Oldambt heeft 70 adressen geselecteerd in hun adressenlijst, 11 hiervan hebben een planningsdatum in 2024 en zijn terug te vinden in het MJVP 2023-okt, (10,1 gewogen adressen), 1 adres heeft nog een planningsdatum staan in het MJVP in 2022 (0,0 gewogen) en 58 hebben nog geen planningsdatum in het MJVP-2023-okt, deze 58 adressen hebben bij elkaar een weging van 2,8, dus zullen naar verwachting bijna allemaal op norm worden beoordeeld en niet versterkt hoeven worden. Voor deze 2,8 gewogen adressen heeft de NCG aangegeven voldoende reserve capaciteit beschikbaar te hebben om deze in 2024 op te pakken. De in totaal 13,1 gewogen adressen die Oldambt volgens hun adressenlijst met de Planvorming willen laten starten, zijn een stuk lager dan de NCG voor Oldambt in het MJVP heeft gereserveerd (31,6).

De capaciteitsplanning van de NCG heeft namelijk ook nog de overloop van de adressen uit het Lokale Plan van 2023 meegenomen, die in 2024 met de Planvorming zullen starten. Hett zou dan ook volgens de NCG mogelijk moeten zijn voor alle 70 nieuw voorgedragen adressen van Oldambt volgend jaar met de Planvorming te kunnen starten.

Het MJVP heeft in 2024 voor de gemeente Oldambt 32 adressen (31,6 gewogen) ingepland om in 2024 de Planvorming te starten (zie tabel 4). Hiervan zijn 11 adressen (10,3 gewogen) afkomstig uit de adressenlijst van de gemeente Oldambt van het PVA voor 2024. De overige 21 adressen (20,3 gewogen) die in het MJVP in 2024 zijn gepland om de Planvorming gestart af te ronden komen uit de overloop van oude adressen uit het Lokale Plan van 2023.

Gemeente Oldambt Ontwerp & Realisatie			
Capaciteit voor Mijlpaal 7 Planvorming gestart van de NCG en de invulling daarvan door de gemeente in PVA2024	2024		
	O&R starten % van 2.218 gewogen adressen	Aantal adressen	Aantal gewogen adressen (verwacht door te gaan naar Planvorming gestart)
Capaciteit door NCG ingepland voor Mijlpaal 7 Planvorming te starten in 2024	1,4%		31,6
Capaciteit genoemd in PVA2024 om met Mijlpaal 7 Planvorming te starten		47	
Geselecteerde adressen in het PVA2024 die volgend jaar starten met Mijlpaal 7 Planvorming		70	13,1
Adressen die in het MJVP (versie 2023-okt) voor volgend jaar Mijlpaal 7 Planvorming gestart gepland staan		32	31,6

Tabel 4: Ontwerp en Realisatie capaciteit volgens de NCG en Oldambt om met de Planvorming te starten en adressen richting uitvoering te brengen.

Capaciteit door NCG ingepland voor Mijlpaal 7 Planvorming te starten in 2024: Capaciteit door NCG gereserveerd en percentageel verdeeld over de gemeenten (11,3 % van 2.218 gewogen adressen: 250).

Capaciteit genoemd in PVA2024 om met Mijlpaal 7 Planvorming te starten: de capaciteit die wordt genoemd in het PVA2024 van Oldambt.

Geselecteerde adressen in het PVA2024 die volgend jaar starten met Mijlpaal 7 Planvorming: de adressen die Oldambt in opdracht geeft aan de NCG om volgend jaar de Planvorming te starten.

Adressen die in het MJVP (versie 2023-okt) voor volgend jaar Mijlpaal 7 Planvorming gestart gepland staan: Adressen voor Mijlpaal 7 Planvorming gestart in het MJVP (versie 2023-okt) voor volgend jaar.

Bijlage 2: Meerjarenplanning versterkingsopgave

In deze bijlage wordt achtereenvolgens een korte toelichting gegeven op de meerjarenplanning (hierna: MJVP) voor de versterkingsopgave, aangegeven welke gegevens zijn gebruikt voor het beoordelen van het programma van aanpak (hierna: PVA) voor 2024 van de gemeente Oldambt en de bevindingen gegeven in relatie tot het MJVP.

Korte toelichting

In het MJVP van de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) wordt voor de scope van de versterkingsopgave aangegeven wanneer gebouwen beoordeeld en zo nodig versterkt kunnen worden. De scope wordt voor de NCG bepaald en er zijn meerdere processen waarmee er gebouwen aan de scope kunnen worden toegevoegd.

In de jaarlijks op en bij te stellen PVA's van de vijf aardbevingsgemeentes, wordt formeel de scope en de prioritering van versterkingsopgave bepaald om door de NCG te worden te worden uitgevoerd. Deze PVA's werden voorheen lokale plannen van aanpak (hierna: LPA) genoemd.

Op basis van de PVA's stelt de NCG een vast te stellen nieuwe versie van het MJVP op en baseert de verdere uitwerking van projectplanningen en de uitvoering van de versterkingsopgave daarop. Gedurende het jaar houdt de NCG de voortgang van de versterkingsoperatie bij, informeert de gemeentes daarover en bespreekt wat de gevolgen voor het MJVP zijn. De NCG werkt met maandelijkse conceptversies van het MJVP om dit inzichtelijk te maken, en er wordt minimaal één tussentijdse vast te stellen versie van het MJVP opgeleverd. Een vastgestelde of meer recente conceptversie van het MJVP is input voor volgende door de gemeentes op en bij te stellen versie van de PVA's. Daarmee is de jaarcyclus van afstemmen PVA's en het MJVP rond.

Het hele proces voor het opnemen en beoordelen, en als dit nodig is, het versterken van een gebouw, is door de NCG opgedeeld in te behalen mijlpalen. De NCG werkt met een MJVP-tool waarmee, met het verwerken van in concrete projecten behaalde en geplande mijlpalen, de ontbrekende mijlpalen worden gepland. Voor nog niet beoordeelde gebouwen is een inschatting gemaakt van het percentage gebouwen dat naar verwachting niet op norm zal worden beoordeeld. Met wegingsfactoren, die o.a. afhankelijk zijn van bouwtype en wijze van beoordelen, is in het MJVP de planning gemaakt om het gewogen aantal te versterken gebouwen te kunnen inschatten. Met het MJVP wordt bepaald wat er moet worden gedaan om de versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden, en kan worden beschouwd of deze doelstelling haalbaar is.

De voortgang en planning van de versterkingsoperatie publiceert de NCG maandelijks op de eigen website. De NCG heeft ook een besloten online dashboard waarmee de vastgestelde planning en de behaalde voortgang visueel inzichtelijk wordt gemaakt. SodM heeft toegang tot dit besloten dashboard en ook tot de achterliggende datasets met daarin aanvullend ook tussentijdse conceptversies van het MJVP.

Uit de achterliggende datasets haalt SodM een:

- 'Bronbestand' met daarin de data van de in projecten gerealiseerde mijlpalen,
- 'MJVP versie' met daarin de behaalde en geplande data, in de hierna volgende tabellen soms nader uitgesplitst in data van in projecten al gerealiseerde (REAL in de tabellen) of geplande (LBE in de tabellen) mijlpalen, en de met de MJVP-tool geplande (MJVP in de tabellen) mijlpalen.

De gerealiseerde data uit een 'Bronbestand' is niet (altijd) synchroon met de gerealiseerde data uit een 'MJVP versie'.

Gebruikte gegevens

Voor het advies over het PVA 2024 van de gemeente Oldambt werkt SodM met:

- het 'Bronbestand 02-10-2023' zoals dat op 02-10-2023 online beschikbaar was,
- het 'MJVP versie 2023 oktober', dat is een tussentijdse conceptversie met datum 12-10-2023, zoals dat op 16-10-2023 online beschikbaar was,
- de adreslijst behorende bij het PVA 2024, met de adressen voor mijlpaal 7 'MP 07 Planvorming gestart' die de NCG in 2024 op moet pakken.

Bevindingen in relatie tot het PVA 2024 van gemeente Oldambt

Aan het einde van deze bijlage worden een aantal tabellen (tabel 5-16, zie: 'Tabellen bijlage 2 – pagina 1-11') gepresenteerd met data van adressen per mijlpaal, in aantallen en gewogen aantallen. Dit zijn verschillende overzichten gebaseerd op dezelfde hierboven genoemde datasets.

De in het PVA genoemde totale scope van 507 adressen wordt in meerdere tabellen aangegeven.

De adreslijst bevat 70 adressen (gewogen 13 adressen) om in 2024 richting uitvoering te brengen. Van deze adressen staan er in 2024 slechts 11 (gewogen 10) adressen in tabel 5, 6, 7 en 8 voor mijlpaal MP 07 (Planvorming gestart) aangegeven. Bij het eindtotaal staan er ook maar 12 (gewogen 10) aangegeven. De 70 adressen van de adreslijst zitten weliswaar in de scope maar zijn in het MJVP slechts deels te vinden bij mijlpaal MP 07 (Planvorming gestart).

In het PVA 2024 wordt aangegeven dat het voorheen de verwachting was dat 50-75 woningen daadwerkelijk versterkt moeten worden, nu wordt aangegeven dat de inschatting is dat 75 adressen daadwerkelijk versterkt moeten worden. In het MJVP wordt echter uitgegaan van een behoorlijk hoger aantal te versterken adressen.

In tabel 5, 6, 7 en 8 staan in 2024 voor mijlpaal MP 07 (Planvorming gestart) in totaal 32 (gewogen 31) adressen aangegeven, en in totaal 122 (gewogen 112) adressen aangegeven.

De MJVP planning voor de verschillende woonplaatsen van gemeente Oldambt staat in tabel 9 tot en met 12 aangegeven voor 2024 en de jaren daarna.

Uit tabel 13 en 14 blijkt dat weliswaar de meeste (her)beoordelingen in 2023 worden afgerond maar dat er ook nog een aantal resterende in 2024.

Dit wordt slechts beperkt veroorzaakt doordat er een aantal adressen in 2023 aan de scope is toegevoegd. Ook blijkt dat de versterkingsopgave in 2026 wordt afgerond. In het algemeen zijn adressen met een verhoogd risicoprofiel eerder ingepland dan adressen met een lichtverhoogd risico, en daarna de adressen met een normaal risicoprofiel. Er zijn uitzonderingen waarbij een aantal adressen met een verhoogd risico later worden versterkt dan adressen met een licht verhoogd of normaal risico.

Uit tabel 15 blijkt dat de gerealiseerde mijlpalen van het 'MJVP versie 2023 oktober' wat verder in de tijd zijn bijgewerkt, maar verder redelijk goed overeenkomen met die van het 'Bronbestand 02-10-2023'.

In tabel 16 is een vergelijking gemaakt met het MJVP van nu en de versie die in 2022 is gebruikt voor het beoordelen van de LPA's 2023. Daaruit blijkt de beperkte toename van de scope, en dat er in 2023 minder adressen versterkt, mijlpaal MP 11 Bouw gereed, zullen worden. Hier is ook duidelijk te zien dat in het MJVP het gewogen aantal adressen voor mijlpaal MP 07 Planvorming gestart is toegenomen van 79 naar 112, terwijl de inschatting daarvoor in het PVA 2024 maar 75 adressen is. De versterkingsopgave wordt volgens het MJVP nog steeds in 2026 afgerond.

Uit o.a. tabel 14 blijkt dat er weliswaar 507 adressen in de scope zitten maar dat voor meerdere mijlpalen niet alle adressen zijn gepland. Er staan bijvoorbeeld maar 488 adressen bij beoordeeld, dat is 19 minder dan de scope. Dat komt wellicht deels door het niet, niet tijdig of onvolledig terugkoppelen en in het MJVP kunnen meenemen van gegevens van projecten in uitvoering. Bij navraag bij de NCG blijkt ook dat de data voor mijlpaal MP 04, MP 05 en MP 05b in deze versie van het MJVP niet geheel correct of gewijzigd toegepast is ten opzichte van eerdere versies. Voor het beoordelen met de Praktijkaanpak 2.0 is recent een aanvullende mijlpaal geïntroduceerd (MP 05c) en wordt er data van de eerder gebruikte mijlpalen daarheen verplaatst. Deze nieuwe mijlpaal was niet beschikbaar in de door SodM beschouwde versie van het MJVP. Mogelijk volgt daaruit dat er nog meer beoordelingen in 2024 gepland zijn dan uit de tabellen hierna blijkt. Deze mijlpalen en gegevens worden aangevuld en gecorrigeerd in een volgende versie van het MJVP.

Er is nu ingeschat dat met het afronden van de versterkingsoperatie in 2027, er 104 - 112 adressen zijn versterkt. Dat aantal kan, met het aanvullen van de scope en de gegevens in het MJVP, verder oplopen. De inschatting daarvoor in het PVA 2024 is maar 75 adressen, er moet dus nog het nodige worden afgestemd en aangepast in het PVA 2024 of in het MJVP.

Tabellen bijlage

Aantallen adressen	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
Oldambt											
12-10-2023											
MJVP versie 2023 oktober											
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd			483	2	14	7	1				507
MP 07 PVA Oldambt			62			7	1				70
1. REAL			62			7	1				70
(leeg)			421	2	14						437
MP 07 Planvorming gestart	1			4	35	35	15	32			122
MP 07 PVA Oldambt						1		11			12
2. LBE						1		5			6
3. MJVP								6			6
(leeg)	1			4	35	34	15	21			110
MP 11 Bouw gereed		1				4	10	30	51	10	106
MP 07 PVA Oldambt								1	6	5	12
2. LBE								1		5	6
3. MJVP									6		6
(leeg)		1				4	10	29	45	5	94
MP 12 Afgerond				3	184	100	51	74	48	19	479
MP 07 PVA Oldambt					2			42	1	10	55
1. REAL					2						2
2. LBE										5	5
3. MJVP								42	1	5	48
(leeg)				3	182	100	51	32	47	9	424

Tabel 5: Overzicht aantallen adressen opdracht planvorming mijlpaal 7, zoals gepland in het MJVP

Gewogen aantallen adressen	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
Oldambt											
12-10-2023											
MJVP versie 2023 oktober											
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd			483	2	14	7	1				507
MP 07 PVA Oldambt			62			7	1				70
1. REAL			62			7	1				70
(leeg)			421	2	14						437
MP 07 Planvorming gestart	1			3	30	32	15	31			112
MP 07 PVA Oldambt						0		10			10
2. LBE						0		5			5
3. MJVP								5			5
(leeg)	1			3	30	32	15	20			102
MP 11 Bouw gereed		1				4	10	29	50	10	104
MP 07 PVA Oldambt								0	5	5	10
2. LBE								0		5	5
3. MJVP									5		5
(leeg)		1				4	10	29	44	5	93
MP 12 Afgerond				3	184	100	51	74	48	19	479
MP 07 PVA Oldambt					2			42	1	10	55
1. REAL					2						2
2. LBE										5	5
3. MJVP								42	1	5	48
(leeg)				3	182	100	51	32	47	9	424

Tabel 6: Overzicht gewogen aantallen adressen opdracht planvorming mijlpaal 7, zoals gepland in het MJVP

Aantallen adressen	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Eindtotaal
Oldambt								
12-10-2023								
MJVP versie 2023 oktober								
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd		483	2	14	7	1		507
1. REAL								
Licht verhoogd risicoprofiel		476	2		1			479
Normaal risicoprofiel		1		14	6	1		22
Verhoogd risicoprofiel		6						6
MP 07 Planvorming gestart	1		4	35	35	15	32	122
1. REAL								
Licht verhoogd risicoprofiel			3	32	33	9		77
Normaal risicoprofiel	1							1
Verhoogd risicoprofiel			1	3	1			5
2. LBE								
Licht verhoogd risicoprofiel					1	6	6	13
3. MJVP								
Licht verhoogd risicoprofiel							22	22
Normaal risicoprofiel							4	4

Tabel 7: Overzicht aantallen adressen opdracht planvorming mijlpaal 7 en scope mijlpaal 1

Gewogen aantallen adressen	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Eindtotaal
Oldambt								
12-10-2023								
MJVP versie 2023 oktober								
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd		483	2	14	7	1		507
1. REAL								
Licht verhoogd risicoprofiel		476	2		1			479
Normaal risicoprofiel		1		14	6	1		22
Verhoogd risicoprofiel		6						6
MP 07 Planvorming gestart	1		3	30	32	15	31	112
1. REAL								
Licht verhoogd risicoprofiel			3	27	31	9		70
Normaal risicoprofiel	1							1
Verhoogd risicoprofiel			0	3	1			4
2. LBE								
Licht verhoogd risicoprofiel					0	6	6	12
3. MJVP								
Licht verhoogd risicoprofiel							21	21
Normaal risicoprofiel							3	3

Tabel 8: Overzicht gewogen aantallen adressen opdracht planvorming mijlpaal 7 en scope mijlpaal 1

Aantallen adressen per woonplaats in opdracht 2024	Drieborg	Finsterwolde	Midwolda	Nieuw Scheemda	Nieuwolda	Oostwold	Scheemda	't Waar	Eindtotaal
Oldambt									
12-10-2023									
MJVP versie 2023 oktober									
MP 04 Opname uitgevoerd			3	2					5
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker		1	4	11	18	12	2	2	50
MP 07 Planvorming gestart	1	1	2	5	19		1	3	32
MP 07 PVA Oldambt	1	1		3	5		1		11
(leeg)			2	2	14			3	21
MP 08 Uitvoeringsplan gereed			3	7	20	1	3	4	38
MP 11 Bouw gereed			1	7	17	1	1	3	30
MP 12 Afgerond			10	17	29	13	1	4	74

Tabel 9: Aantallen adressen per woonplaats opdracht 2024

Gewogen aantallen adressen per woonplaats in opdracht 2024	Drieborg	Finsterwolde	Midwolda	Nieuw Scheemda	Nieuwolda	Oostwold	Scheemda	't Waar	Eindtotaal
Oldambt									
12-10-2023									
MJVP versie 2023 oktober									
MP 04 Opname uitgevoerd			3	2					5
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker		1	4	11	18	12	2	2	50
MP 07 Planvorming gestart	1	1	2	5	18		1	3	31
MP 07 PVA Oldambt (leeg)	1	1		3	5		1		10
			2	2	13			3	20
MP 08 Uitvoeringsplan gereed			3	7	19	1	3	4	37
MP 11 Bouw gereed			1	7	16	1	1	3	29
MP 12 Afgerond			10	17	29	13	1	4	74

Tabel 10: Gewogen aantallen adressen per woonplaats opdracht 2024

Resterende aantallen adressen per woonplaats na afronden opdracht 2024	Drieberg	Finsterwolde	Midwolda	Nieuw Scheemda	Nieuwolda	Oostwold	Scheemda	't Waar	Eindtotaal
--	----------	--------------	----------	----------------	-----------	----------	----------	---------	------------

Oldambt

12-10-2023

MJVP versie 2023 oktober

MP 08 Uitvoeringsplan gereed	1	1	2	5	12		1	2	24
MP 11 Bouw gereed	1	1	5	13	31	1	4	5	61
MP 12 Afgerond	1	1	5	13	33	1	5	8	67

Tabel 11: Resterende aantallen adressen per woonplaats na afronden opdracht 2024

Resterende gewogen aantallen adressen per woonplaats na afronden opdracht 2024	Drieberg	Finsterwolde	Midwolda	Nieuw Scheemda	Nieuwolda	Oostwold	Scheemda	't Waar	Eindtotaal
--	----------	--------------	----------	----------------	-----------	----------	----------	---------	------------

Oldambt

12-10-2023

MJVP versie 2023 oktober

MP 08 Uitvoeringsplan gereed	1	1	2	5	12		1	2	23
MP 11 Bouw gereed	1	1	5	13	30	1	4	5	60
MP 12 Afgerond	1	1	5	13	33	1	5	8	67

Tabel 12: Resterende gewogen aantallen adressen per woonplaats na afronden opdracht 2024

Aantallen adressen versterkingsopgave	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
Oldambt												
12-10-2023												
MJVP versie 2023 oktober												
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd				483	2	14	7	1				507
MP 04 Opname uitgevoerd		1		18	216	39	68	23	5			370
MP 05 Beoordeling vastgesteld		1			70	231	72	76	38			488
1. REAL												
Licht verhoogd risicoprofiel					66	231	70	48				415
Normaal risicoprofiel		1						14				15
Verhoogd risicoprofiel					4		2					6
2. LBE												
Licht verhoogd risicoprofiel								14				14
3. MJVP												
Licht verhoogd risicoprofiel									38			38
MP 05b Herbeoordeling vastgesteld						1	13	47				61
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker					17	92	45	28	50			232
MP 07 Planvorming gestart		1			4	35	35	15	32			122
MP 08 Uitvoeringsplan gereed					1	1	5	37	38	24		106
MP 10 Bouw gestart					1	1	4	16	51	32		105
MP 11 Bouw gereed				1			4	10	30	51	10	106
MP 12 Afgerond					3	184	100	51	74	48	19	479

Tabel 13: Aantallen adressen versterkingsopgave

Gewogen aantallen adressen versterkingsopgave	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
Oldambt												
12-10-2023												
MJVP versie 2023 oktober												
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd				483	2	14	7	1				507
MP 04 Opname uitgevoerd		1		18	216	39	68	23	5			370
MP 05 Beoordeling vastgesteld		1			70	231	72	76	38			488
MP 05b Herbeoordeling vastgesteld						1	13	47				61
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker					17	92	45	28	50			232
MP 07 Planvorming gestart	1				3	30	32	15	31			112
1. REAL												
Licht verhoogd risicoprofiel					3	27	31	9				70
Normaal risicoprofiel	1											1
Verhoogd risicoprofiel					0	3	1					4
2. LBE												
Licht verhoogd risicoprofiel							0	6	6			12
3. MJVP												
Licht verhoogd risicoprofiel									21			21
Normaal risicoprofiel									3			3
MP 08 Uitvoeringsplan gereed					1	1	5	36	37	23		104
MP 10 Bouw gestart					1	1	4	15	50	31		103
MP 11 Bouw gereed			1				4	10	29	50	10	104
MP 12 Afgerond					3	184	100	51	74	48	19	479

Tabel 14: Gewogen aantallen adressen versterkingsopgave

Vergelijking gerealiseerde aantallen adressen in het Bronbestand en in het MJVP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				2023	Eindtotaal
								2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4	Totaal	
Oldambt													
2-10-2023													
View Bronbestand online (REAL)													
MR 01 aan_werkvoorraad_toegevoegd_realisatie				483	2	14	7				1	1	507
MR 04 opname_uitgevoerd_realisatie		1		18	227	101	94	1	1			2	443
MR 05 beoordeling_vastgesteld_realisatie		1			70	231	72	12	7	42		61	435
MR 05b herbeoordeling_vastgesteld_realisatie						1	5	4	4	11		19	25
MR 06a va_gedeeld_met_eigenaar/gebruiker_realisatie					17	92	45	13		1		14	168
MR 07 planvorming_gestart_realisatie	1				4	35	34	2	5	2		9	83
MR 08 uitvoeringsplan_gereed_realisatie					1	1	4	2	2	7		11	17
MR 10 bouw_gestart_realisatie					1	1	4		2	1		3	9
MR 11 bouw_gereed_realisatie			1				4						5
MR 12 afgerond_realisatie					3	184	98	2	11	19		32	317
12-10-2023													
MJVP versie 2023 oktober													
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd				483	2	14	7				1	1	507
MP 04 Opname uitgevoerd		1		18	216	39	68		1			1	343
MP 05 Beoordeling vastgesteld		1			70	231	72	12	7	42	1	62	436
MP 05b Herbeoordeling vastgesteld						1	5	4	4	11	3	22	28
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker					17	92	45	13		1		14	168
MP 07 Planvorming gestart	1				3	30	32	2	5	2		9	75
MP 08 Uitvoeringsplan gereed					1	1	5	2	2	7		11	18
MP 10 Bouw gestart					1	1	4		2	1		3	9
MP 11 Bouw gereed			1				4			1		1	6
MP 12 Afgerond					3	184	98	2	11	19	4	36	321

Tabel 15: Vergelijking gerealiseerde aantallen adressen in het Bronbestand en in het MJVP

Vergelijking gewogen aantallen adressen MJVP versies	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
Oldambt												
3-10-2022												
MJVP versie 2022.3												
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd				483	2	14	5					504
MP 04 Opname uitgevoerd		1		18	228	115	85	15				462
MP 05 Beoordeling vastgesteld		1			71	247	111	59				489
MP 05b Herbeoordeling vastgesteld						1	51	5				57
MP 06 Normbesluit genomen					3	121	85					209
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker					17	92	17	87				213
MP 07 Planvorming gestart	1				3	30	27	12	6			79
MP 08 Uitvoeringsplan gereed					1	2	15	44	10			72
MP 10 Bouw gestart					1	1	11	32	19	6		70
MP 11 Bouw gereed			1				5	30	21	6	6	69
MP 12 Afgerond					3	184	89	31	41	70	40	458
12-10-2023												
MJVP versie 2023 oktober												
MP 01 Aan werkvoorraad toegevoegd				483	2	14	7	1				507
MP 04 Opname uitgevoerd		1		18	216	39	68	23	5			370
MP 05 Beoordeling vastgesteld		1			70	231	72	76	38			488
MP 05b Herbeoordeling vastgesteld						1	13	47				61
MP 06 Normbesluit genomen					3	120	89	30				242
MP 06a VA gedeeld met eigenaar/ gebruiker					17	92	45	28	50			232
MP 07 Planvorming gestart	1				3	30	32	15	31			112
MP 08 Uitvoeringsplan gereed					1	1	5	36	37	23		104
MP 10 Bouw gestart					1	1	4	15	50	31		103
MP 11 Bouw gereed			1				4	10	29	50	10	104
MP 12 Afgerond					3	184	100	51	74	48	19	479

Tabel 16: Vergelijking gewogen aantallen adressen MJVP versies
